


**MATRIZ DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018**


**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017.**

ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	1	2%
OBRAS EN PROCESO	48	86%
OBRAS PENDIENTE	7	13%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

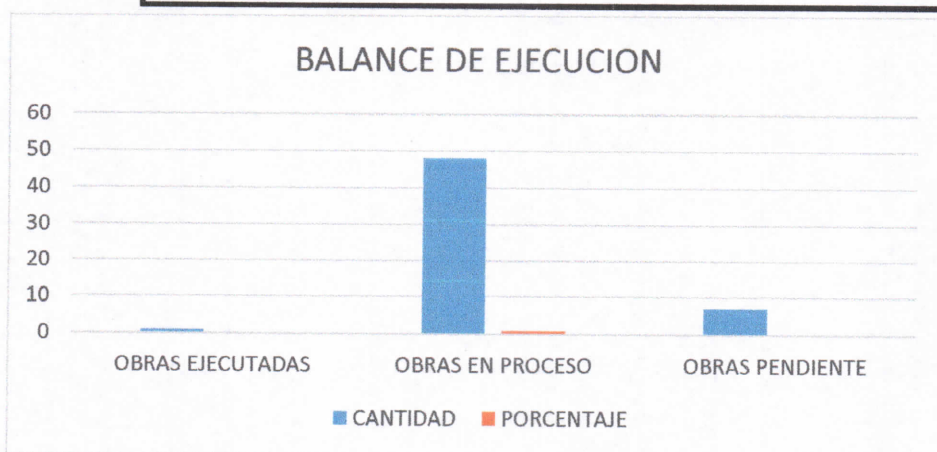

**2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADA Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$45,989,635.05	RD\$19,835,663.12	RD\$26,153,971.93	43%

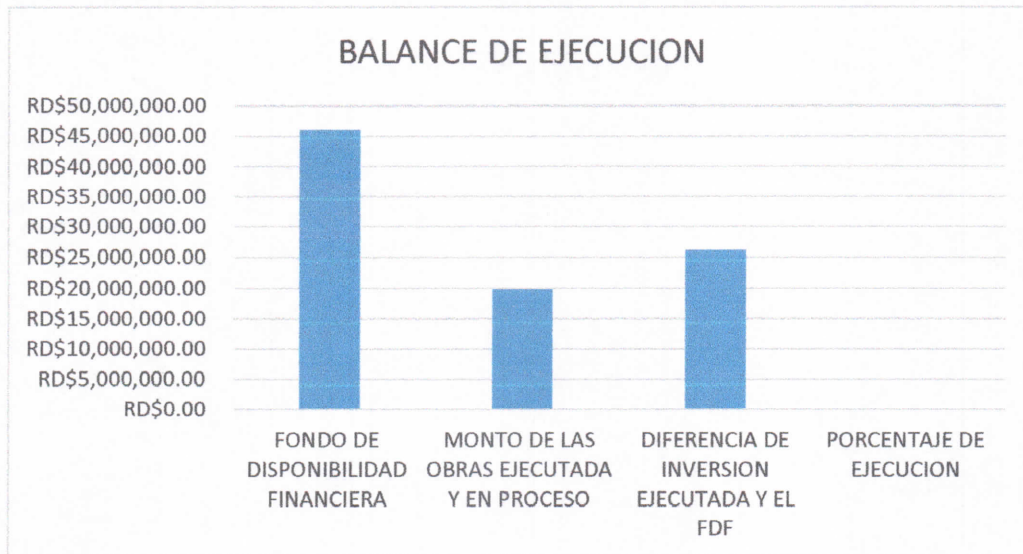

Ing. Elida Almonte Vasquez  
Encargada de Presupuesto Participativo

10/09/2018

Fecha





Ayuntamiento Municipal  
San Francisco De Macoris  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL



MATRIZ DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F-PROGRAMADA	DESCRIPCION OBRA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES	OLIMPIA	982,409.00			X			
2	0052	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	EL AGUACATE	990,488.00				X		
3	0053	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 1,239ML DE ACERAS Y 160ML DE CONTENES	LOS RIELES	1,355,413.00				X		
4	0054	CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES	SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA	808,073.00			X			
5	0055	CONSTRUCCION DE 363.34ML DE ACERAS Y 363.34ML DE CONTENES	EN LA CALLE PORFIRIO JEREZ Y EN LA CALLE TANCREDO VARGAS DEL SECTOR MAMA TINGO DE VISTA DEL VALLE	725,991.00				X		
6	0056	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS, 300ML DE CONTENES Y UN BADEN (7,90MT X 2,00MT)	SAN MIGUEL	666,169.00			X			
7	0057	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	EN EL SECTOR JESUS DE NAZARENO	966,346.00				X		
8	0058	CONSTRUCCION DE 630ML ACERAS Y 630ML DE CONTENES	VILLA VERDE	1,178,757.00				X		
9	0059	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	ESPINOLA I (ENTRANDO POR	586,285.00				X		



**CONT. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS**

No.	CODIGO F-PROGRAMADA	DESCRIPCION OBRA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
10	0060	CONSTRUCCION DE 108ML DE ACERAS, 108ML DE CONTENES Y 243 MT2 EN HORMIGON ARMADO	LA GUAZUMA COTE	529,163.00			X			
11	0061	CONSTRUCCION DE 350ML DE ACERAS Y 350ML DE CONTENES	LOS JARDINES TERCERA ETAPA	701,485.00			X			
12	0062	CONSTRUCCION DE 1,302 DE ACERAS Y 220ML DE CONTENES	URBANIZACION TORIBIO PIANINI	1,437,098.00			X			
13	0063	CONSTRUCCION DE 300ML DE CONTENES Y 300ML DE ACERAS	EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	581,884.00			X			
14	0064	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES E NUEVA	EN EL SECTOR DE VISTA	982,409.00				X		
15	0065	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	LAS COLINAS 2DA. ETAPA	990,488.00				X		
16	0066	CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES	EN EL SECTOR DE VILLA HORTENCIA	800,560.00			X			
17	0067	CONSTRUCCION DE 400 DE ACERAS Y 400 DE CONTENES	EN EL SECTOR GUZMAN CENTRO (PROLONGACION DUARTE)	808,775.00			X			
18	0068	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	URBANIZACION PRIMAVERAL	990,488.00				X		
19	69	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	VISTA LINDA	597,051.00			X			
20	0073	CONSTRUCCION DE 143ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	LA ALTAGRACIA	1,273,750.00				X		
21	0074	CONSTRUCCION DE 65ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	SANTA LUISA	534,605.00			X			



**CONT. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS**

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
22	0075	IMPRIMACION ASFALTICA EN CALLES	SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA DE VISTA DEL VALLE	1,288,382.00						sin Inciar
23	0076	IMPRIMACION ASFALTICA DE 1000MT2	MONSEÑOR DE JESUS MOYA	443,414.00	249,996.00	X				Terminado
24		IMPRIMACION ASFALTICA DE 2,700MT2	BIJAO ADENTRO	1,364,158.00						Sin Iniciar
25	0078	IMPRIMACION ASFALTICA DE 1,081.50MT2	LA YAGUIZA	577,352.00						Sin Iniciar
26	0080	IMPRIMACION ASFALTICA DE 500MT2	URB. COLINAS DEL NORDESTES	397,520.00						Sin Iniciar
27	0081	CONSTRUCCION DE 200ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	MIRABEL	1,673,608.00				X		Sin Iniciar
28	0082	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT20	BARRIO LINDO	1,362,932.00						Sin Iniciar
29	0083	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT2	FIGUEROA	1,353,031.00						Sin Iniciar
30	0084	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2,500MT2	MADEJA AFUERA(DESTTRAS DEL LICEO)	1,113,668.00						Sin Iniciar
31	0085	CONSTRUCCION DE 3000MT2 DE AFIRMADO	HATILLO (DESPUES DEL COLEGIO MEDICO)	1,336,279.00						Sin Iniciar
32	0086	ENCEMENTADO DE 1,535.46MT2 EN HORMIGON ARMADO Y 193.50MT2 EN HORMIGON SIMPLE DE	GREGORIO LUPERON II ETAPA	2,129,920.00				X		Sin Iniciar
33	0087	ENCEMENTADO DE 1,600MT2 DE HORMIGON ARMADO	CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON 2DA ETAPA	2,005,560.00				X		Sin Iniciar
34	0088	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT2 CALLEION DE	LA YAGUIZA	1,364,158.00						Sin Iniciar
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS RD\$</b>				<b>32,936,460.00</b>						



**REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION**

No.	CODIGO F-	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REPARACION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	SAN MARTIN	540,079.00			X			
<b>TOTAL REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION RD\$</b>				<b>540,079.00</b>						

**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

No.	CODIGO F-	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA Y UNA GRADA	EN LA COMUNIDAD DE LOS ESPINOS	1,362,291.00				X		
2	0052	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA Y UNA GRADA (10ML) Y 60ML DE VERIAS PRIMETRAL	EN LA URBANIZACION CAPERUZA II	1,681,434.00				X		
3	0053	CONSTRUCCION DE UNA GRADA (20ML), 27.74ML DE MALLA CICLONICA EN VERIA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS Y REMODELACION DE LA CANCHA	EN LA COMUNIDAD DE BIJAO AFUERA	947,596.00				X		
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS RD\$</b>				<b>3,991,321.00</b>						

**REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS RD\$**

No.	CODIGO F-	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REPARACION DEL PLAY PERDOMO Y REPARACION DE LA CASA CLUB	EN EL SECTOR EL CAPACITO	1,643,494.00	1,000,494.00			X		
<b>REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS RD\$</b>				<b>1,643,494.00</b>						

328,698.80



**CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVA**

No.	CODIGO F-PROGRAMADA	DESCRIPCION OBRA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL	LA JOYA	2,162,822.00				X		
2	0052	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL	LOS MAESTROS	3,001,721.00				X		
3	0054	CONSTRUCCION PARQUE	URBANIZACION CAPERUZA II, CERCA DEL PLAY	2,377,207.00				X		
<b>TOTAL CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVA RD\$</b>				<b>7,541,750.00</b>						

**REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS**

No.	CODIGO F-PROGRAMADA	DESCRIPCION OBRA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REMOZAMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	URBANIZACION CAPERUZA 1	1,197,561.00				X		
<b>REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS RD\$</b>				<b>1,197,561.00</b>						

**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS**

No.	CODIGO F-PROGRAMADA	DESCRIPCION OBRA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0056	CONSTRUCCION DE 146MIL DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN EL CLUB	URBANIZACION ABREU	923,010.01		100%		X		
1		Cosntrucción de un Centror Comunal	Ens Duarte	1,131,499.00	1,295,963.00		X			
2	0058	CONSTRUCCION DE 74MIL DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN EL CLUB	HATILLO CENTRO	446,563.01				X		
3	0059	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	LOS CHIRIPOS	271,572.00				X		




**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE**

No.	CODIGO F.	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0052	CONSTRUCCION DE 95ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO PARA DRENAJE PLUVIAL	URBANIZACION CAONABO II	757,688.00				X		
2	0053	COLOCACION DE 67.60ML DE ALCANTARILLAS DE 24"	VILLA REAL	363,835.00				X		
<b>TOTAL RD\$ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE</b>				<b>1,121,523.00</b>						

**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS**

No.	CODIGO F.	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE 166ML DE CANALETA	MANHATTAN	1,376,044.00		100%		X		
2	0052	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DE 20,000GALS	EL CIGUAL	766,192.00				X		
<b>TOTAL RD\$ REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE</b>				<b>2,142,236.00</b>						

  
**Ing. Eida Almonte Vasquez**  
 Encargada de Presupuesto Participativo



10/09/2018  
 Fecha
